

Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2022

Laren Regenklaar

Het project Laren Regenklaar (LRK) heeft als doel om de Gemeente Laren klaar te maken voor extreme regenbuien. Deze extreme buien zorgen sinds 2014 regelmatig voor grote overlast en schade in Laren. Voor Laren Regenklaar is een Masterplan opgesteld en op basis daarvan een Uitvoeringsagenda met diverse maatregelen per deelgebied. Elk jaar pakken we een aantal deelgebieden integraal aan.

Het regenklaar maken van Laren realiseren we door aanpassingen in de openbare ruimte, door het afkoppelen van particuliere woningen, openbare gebouwen en bedrijfspanden en door beschermende maatregelen bij particulieren.

Projectdoelstellingen en voortgang

De projectdoelstellingen zijn vooraf niet specifiek geformuleerd, maar vanaf de eerste voortgangsrapportage wel gehanteerd zoals in de tabel hieronder beschreven. De tweede kolom toont de actuele stand van zaken.

Doelstelling	Stand van zaken voortgang Q3 - 2022
<u>Maatregelen</u> : Het project Laren Regenklaar realiseren conform de beschrijving van het Masterplan en de uitwerking daarvan in de Uitvoeringsagenda.	De medewerking van particulieren aan maatregelen van Laren Regenklaar op hun perceel is nog steeds groot: ruim 85%.
<u>Planning</u> : Zorgdragen dat Laren ook werkelijk regenklaar is op 31-12-2024.	Uitvoering deelprojecten ligt op schema. Goed vooruitplannen voor periode tot eind 2024 en daarbij afstemmen met OR/RO en voor enkele deelprojecten met gemeenteraad/bewoners blijft belangrijk.
<u>Budget</u> : Het project realiseren binnen het budget van 11,432 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit kredieten van het GRP, afkoppelen gemeentelijke panden en Maatregelen wateroverlast.	Bij de tot nu toe uitgevoerde deelprojecten ligt de aanneemsom veelal hoger dan begroot (o.a. door prijsstijgingen materialen). Daardoor hebben we voor 2023 een extra investeringsbudget van 350.000 euro in de gemeentelijke begroting laten opnemen. En wordt er opnieuw subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Daarmee kan de doelstelling waarschijnlijk gehaald worden.

Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2022

Samenvatting in cijfers

Maatregel:	Totaal:	Klaar:	Type:
Pand afkoppelen (35mm)	1350	52 79	zonder advies/wijkt af met advies
Gootje naar OR	1000	8 209	zonder advies/wijkt af met advies
Ontspanningsput	2700	52 441	zonder advies/wijkt af met advies
Totaal panden (adrespunten):	5050	841	

Openbare ruimte			
Kolken af te koppelen	1.450	281	19%

Onderdeel	Opgave	Gerealiseerd	Percentage
Vergoeding bewoners (st)	94	94	100%

Voortgang Projecten


Activiteiten in Q4-2022:

- ✓ Vervolg uitvoeren deelproject woningen Vredelaan en omgeving (particulieren)
- ✓ Vervolg uitvoering deelproject Hoefloo-Houtweg-Hilversumseweg (particulieren en openbare ruimte)
- ✓ Uitvoering werkzaamheden in openbare ruimte Laren Hoog Noord.
- ✓ Uitvoering laatste deel werkzaamheden project College De Brink.
- ✓ Afronden en aanbesteden afkoppelplan school Laar en Berg.
- ✓ Voorbereiding/ontwerpwerk woningen Naarderstraat en omgeving.
- ✓ Participatietraject waterberging Brink, samen met deelgebied Centrum
- ✓ Aanbesteding deelproject ontspanningsputten Laren Noordoost.

Verwachte activiteit in Q1-2023:

- Uitvoering afkoppelplan school Laar en Berg.
- Afronden uitvoeren deelproject woningen Vredelaan en omgeving (particulieren)
- Vervolg uitvoering deelproject Hoefloo-Houtweg-Hilversumseweg (particulieren en openbare ruimte)
- Uitvoering deelproject Laren Hoog Noord (vervolg openbare ruimte en start particulieren)
- Uitvoering deelproject ontspanningsputten Laren Noordoost.
- Vervolg participatie waterberging Brink, samen met deelgebied Centrum.
- Aanbesteding woningen Naarderstraat en omgeving.
- Voorbereiden ontwerpwerk deelproject Drift en omgeving
- Voorbereiden deelproject ontspanningsputten Zuid-Oost.

Gerealiseerd

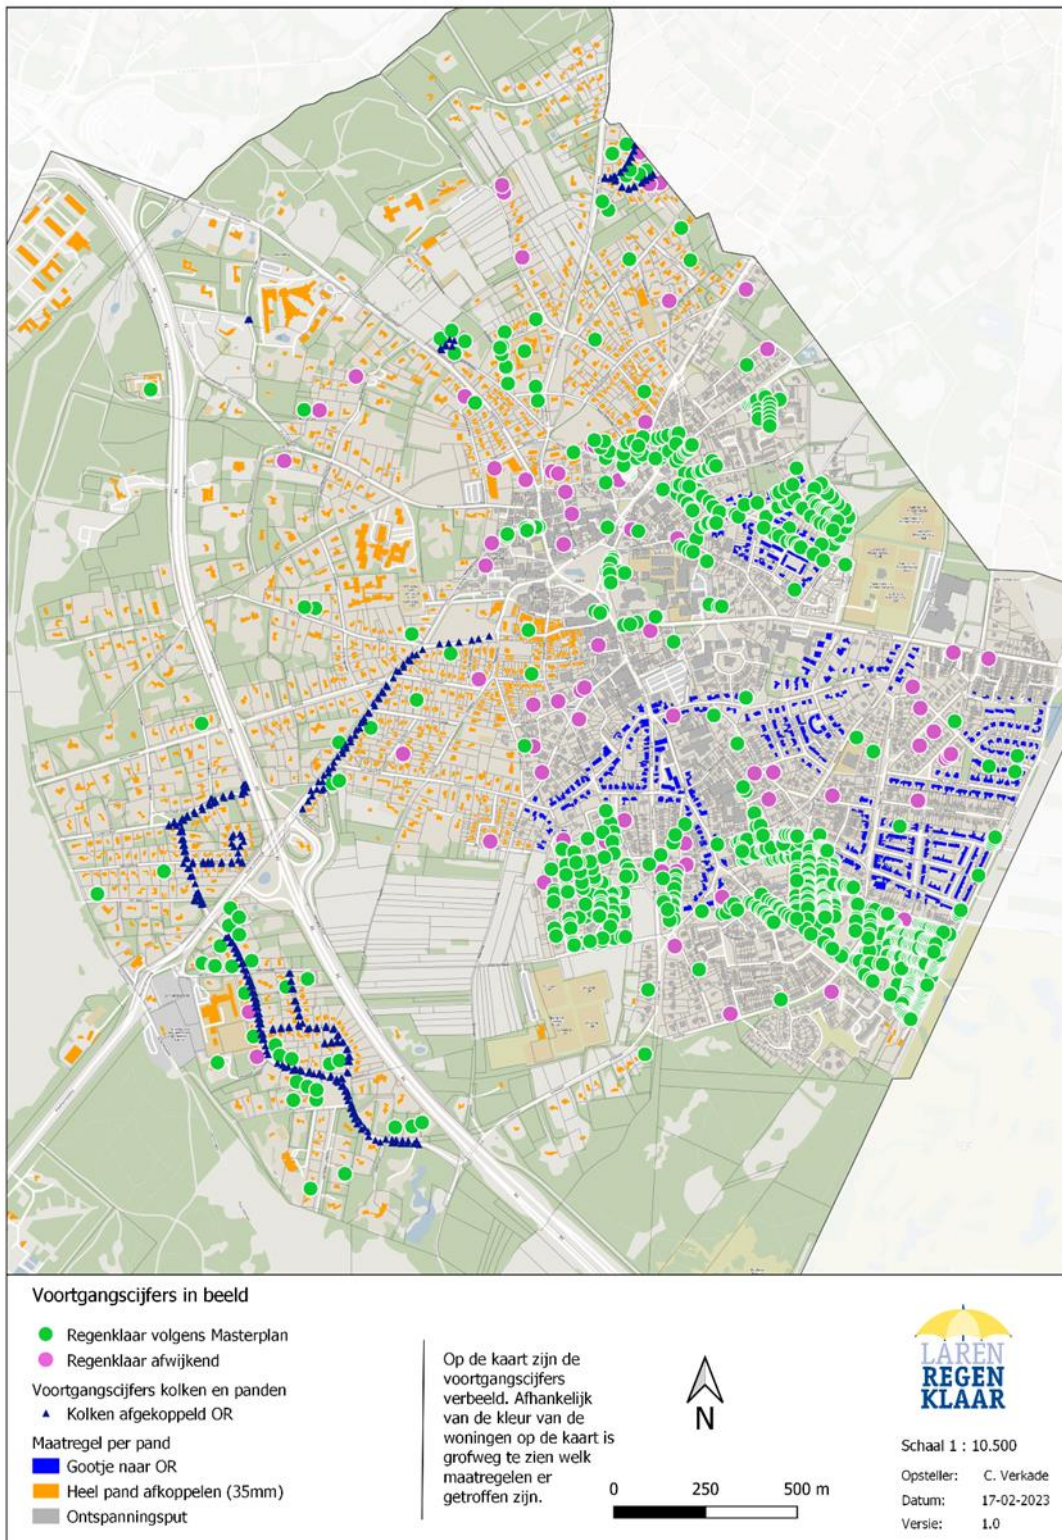

Planning per gebied

