

Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2023

Laren Regenklaar

Het project Laren Regenklaar (LRK) heeft als doel om de Gemeente Laren klaar te maken voor extreme regenbuien. Deze extreme buien zorgen sinds 2014 regelmatig voor grote overlast en schade in Laren. Voor Laren Regenklaar is een Masterplan opgesteld en op basis daarvan een Uitvoeringsagenda met diverse maatregelen per deelgebied. Elk jaar pakken we een aantal deelgebieden integraal aan.

Het regenklaar maken van Laren realiseren we door aanpassingen in de openbare ruimte, door het afkoppelen van particuliere woningen, openbare gebouwen en bedrijfspanden en door beschermende maatregelen bij particulieren.

Projectdoelstellingen en voortgang

De projectdoelstellingen zijn vooraf niet specifiek geformuleerd, maar vanaf de eerste voortgangsrapportage wel gehanteerd zoals in de tabel hieronder beschreven. De tweede kolom toont de actuele stand van zaken.

Doelstelling	Stand van zaken voortgang Q4 - 2023
<u>Maatregelen</u> : Het project Laren Regenklaar realiseren conform de beschrijving van het Masterplan en de uitwerking daarvan in de Uitvoeringsagenda.	De medewerking van particulieren aan maatregelen van Laren Regenklaar op hun perceel is nog steeds groot: ruim 85%.
<u>Planning</u> : Zorgdragen dat Laren ook werkelijk regenklaar is op 31-12-2024.	De uitvoering van deelprojecten ligt behoorlijk op schema, maar enkele projectgebieden komt pas na 2024 aan de beurt. Het gaat dan met name om gebieden waarbij de werkzaamheden voor Laren Regenklaar onderdeel uitmaken van een groter project, zoals de reconstructie van een straat zoals de Jordaan door team Openbare Ruimte.
<u>Budget</u> : Het project realiseren binnen het budget van 11,432 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit kredieten van het GRP, afkoppelen gemeentelijke panden en Maatregelen wateroverlast.	Bij de tot nu toe uitgevoerde deelprojecten ligt de aanneemsom veelal hoger dan begroot (o.a. door prijsstijgingen materialen). Ook individuele maatregelen zijn duurder dan begroot. Daarom is voor 2023 een extra investeringsbudget van 350.000 euro opgenomen bovenop het reeds begrote bedrag. Verder heeft Laren Regenklaar voor de derde keer een subsidie van 100.000 euro ontvangen van de provincie. Daarmee kan de doelstelling waarschijnlijk gehaald worden.

Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2023

Samenvatting in cijfers

Maatregel:	Totaal:	Klaar:	%
Panden uitgevoerd volgens Masterplan		942	
Panden afgekoppeld buiten Masterplan om		84	
Panden reeds afgekoppeld of rieten dak		879	
Panden afwijkend van Masterplan		70	
Totaal panden (adrespunten):	5.050	1.975	39,1

Openbare ruimte			
Kolken af te koppelen	1.450	535	37%

Voortgang Projecten

Activiteiten in Q4-2023:

- Uitvoering project Hoefloo-Houtweg-Hilversumseweg
- Uitvoering afkoppelwerkzaamheden particulieren en openbare ruimte Naarderstraat en omgeving.
- Uitvoering afkoppelwerkzaamheden particulieren en openbare ruimte gebied Vredelaan Oost en omgeving.
- Aanbesteding van deelgebied Centrum/De Rijt.
- Aanbesteding ontspanningsputten Zuidoost.
- Aanbesteding deelgebied Centrum.
- Voorbereiding uitvoering waterberging Brink.
- Voorbereiding en aanbesteding afkoppelwerkzaamheden gebied Drift en omgeving.
- Voorbereiding afkoppelwerkzaamheden gebied Tafelbergweg en omgeving.


Verwachte activiteit in de komende periode:

- Vervolg proces waterberging Brink.
- Uitvoering afkoppelwerkzaamheden deelgebied Centrum.
- Uitvoering afkoppelwerkzaamheden gebied Drift en omgeving.
- Aanbesteding en uitvoering afkoppelwerkzaamheden gebied Tafelbergweg en omgeving.
- Voorbereiden ontwerpwerk afkoppelwerkzaamheden gebied Sint Janstraat en omgeving.
- Voorbereiden wijken met ontspanningsputten in Laren Laag.

Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2023



Gerealiseerd

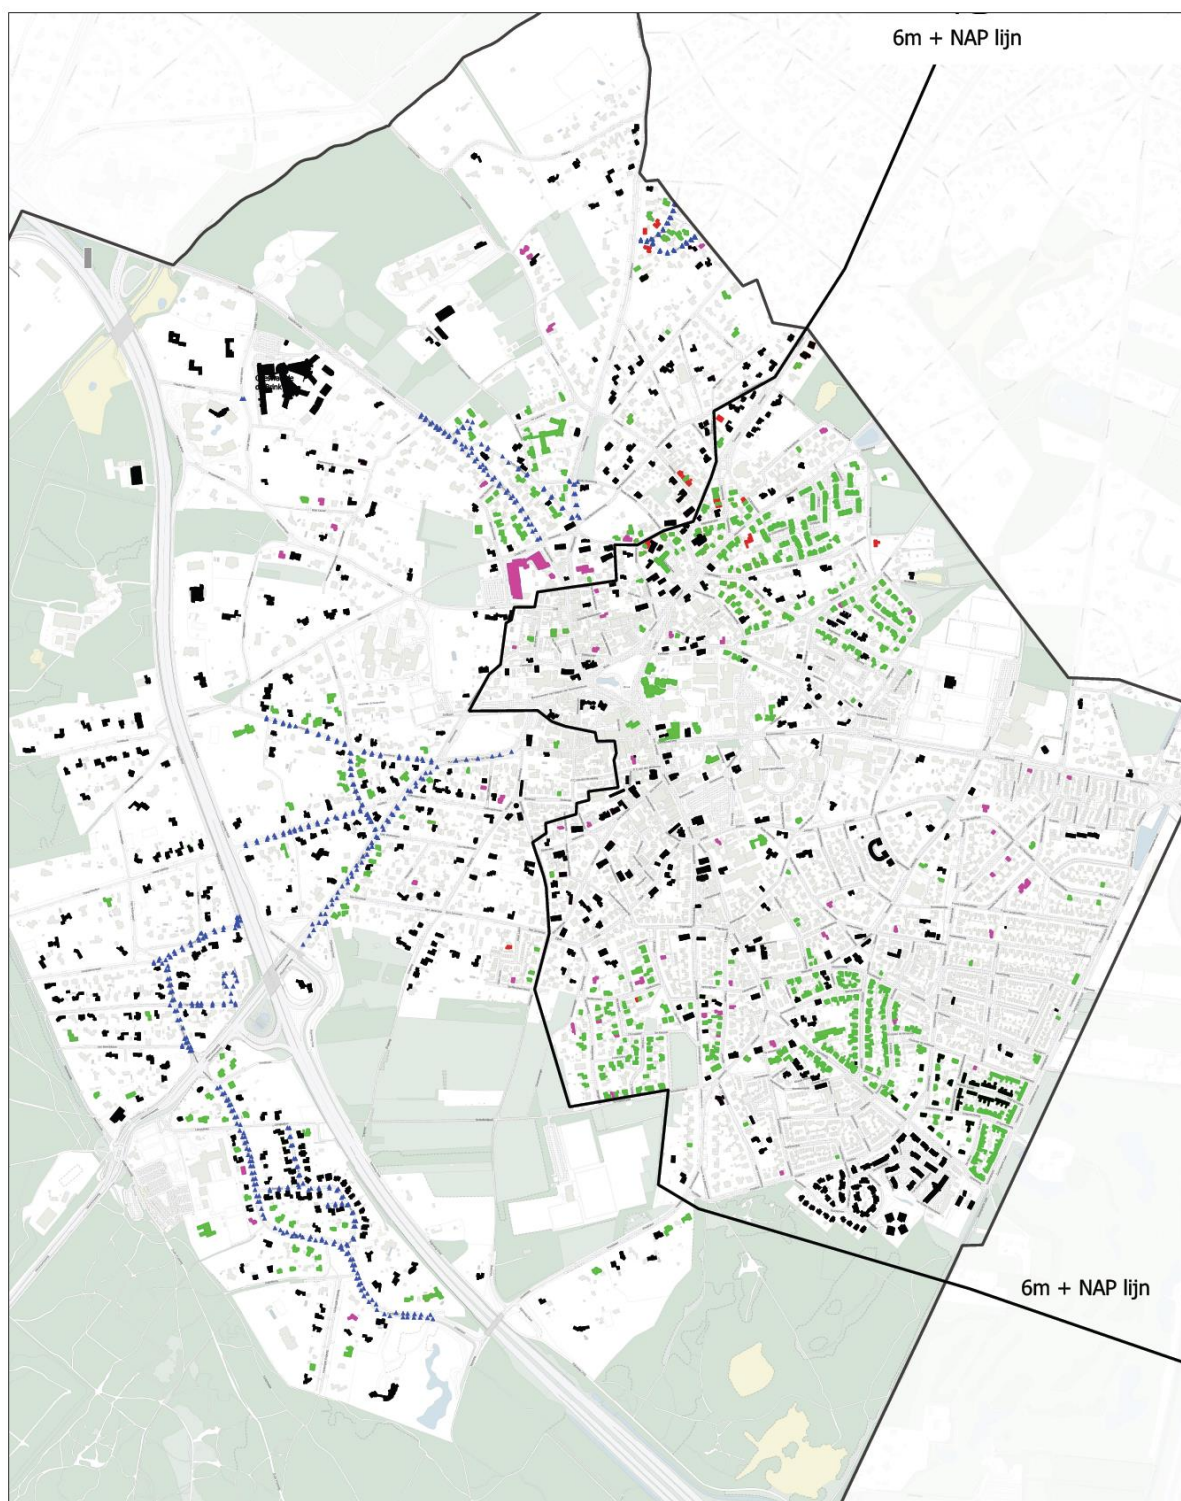

Voortgang per gebied

Status per pand
■ Afgekoppeld volgens Masterplan
■ Afgekoppeld buiten Masterplan om
■ Afwijkend van Masterplan
■ Reeds afgekoppeld of riets kap
- Kolken afgekoppeld

0 250 500 m

Panden aan de westkant van de 6m + NAP lijn worden afgekoppeld. Panden aan de oostkant krijgen beschermende maatregelen. In sommige gevallen wordt de helft van het pand afgekoppeld. Dit gebeurt alleen op plekken waar een gescheiden rioolstelsel ligt.



Datum: 23-02-2024

Versie: 1.1

Opsteller: C. Verkade



Voortgangsrapportage Laren Regenklaar Q4 – 2023



Planning per gebied

